


Türkiye’de Proje Başarısı Ölçümleri Araştırması


Türkiye’de, farklı sektörler ve farklı ölçeklerde gerçekleştirilen projelerin, başarı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla 320 projelerden elde edilen veriler, İstanbul S. Zaim Üniversitesi’nden Dr. Canser Bilir ve Elif Yafez tarafından incelenmiştir. Proje verileri; çoğunlukla proje yöneticileri, proje sponsoru ve çekirdek ekip üyeleri gibi proje ile doğrudan ilgili çalışanlardan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların özeti aşağıda yer almaktadır.

Genel Başarı Oranı:

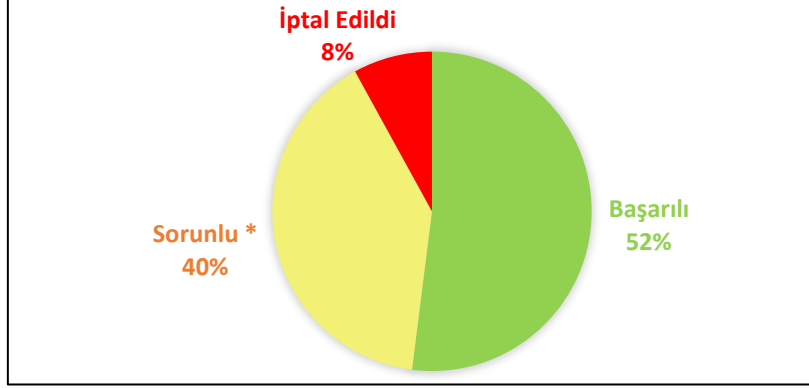


* Sorunlu projeler, bütçesinde ve / veya zamanında tamamlanmayan veya kapsamında önemli bir eksik ile birlikte tamamlanan projeleri ifade etmektedir.

Sektörel olarak ise başarılı tamamlanma oranlarının aşağıdaki gibi değiştiği sonucu elde edilmiştir:

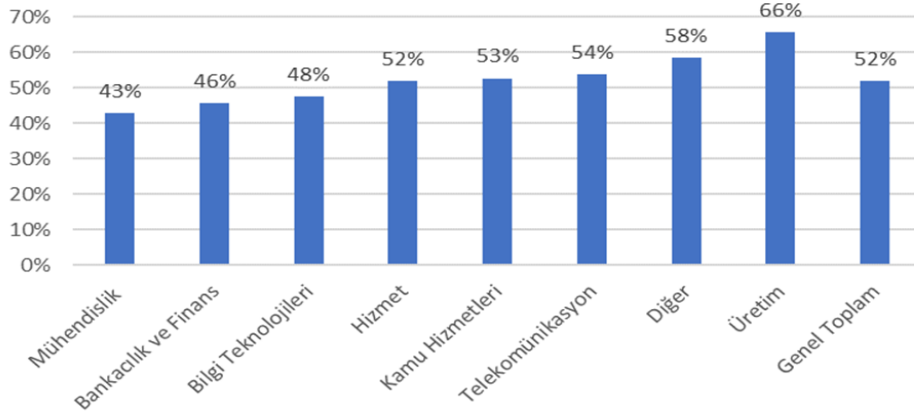


Projelerin zamanında tamamlanma ve geciken projelerin gecikme süresi dağılımları aşağıdaki gibidir:


Zamanında Tamamlanma Oranları

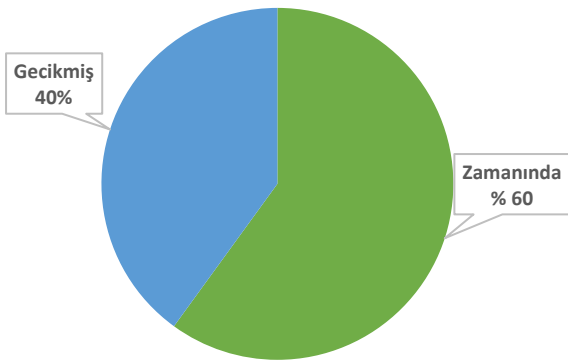


Süreden Aşma Oranları

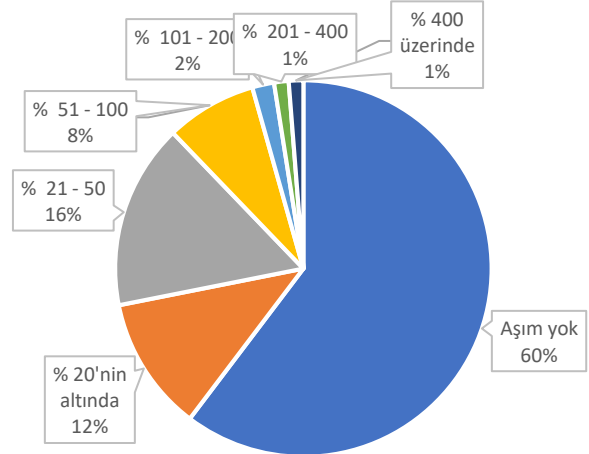

Projelerin bütçesinde tamamlanma ve bütçe aşıldı ise bütçe aşım yüzdeleri aşağıdaki gibidir:

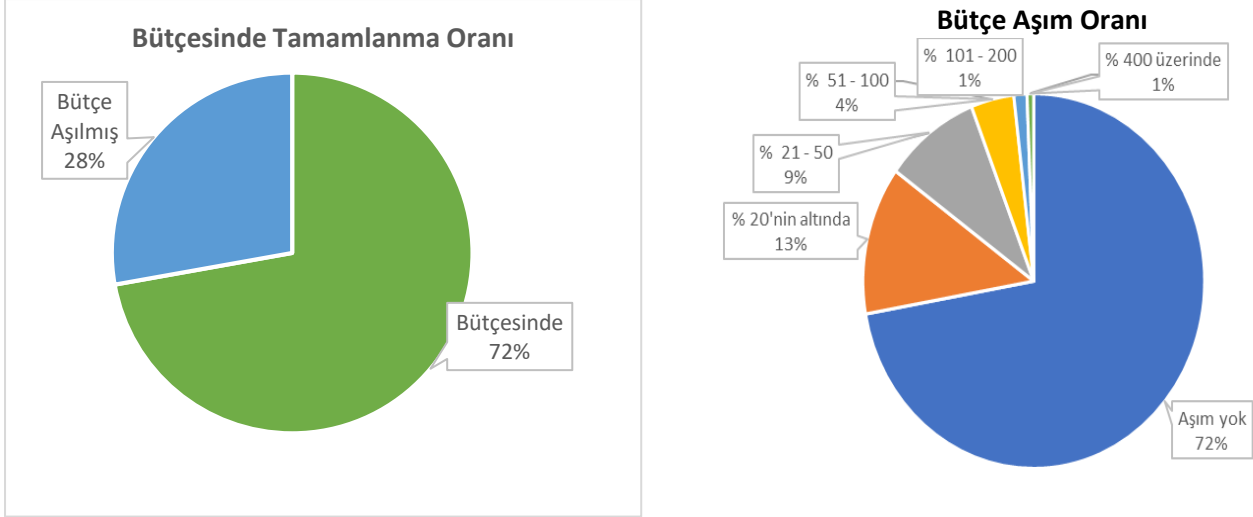

Projelerin belirlenen kapsama uygunluğu ile ilgili değerlendirme ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

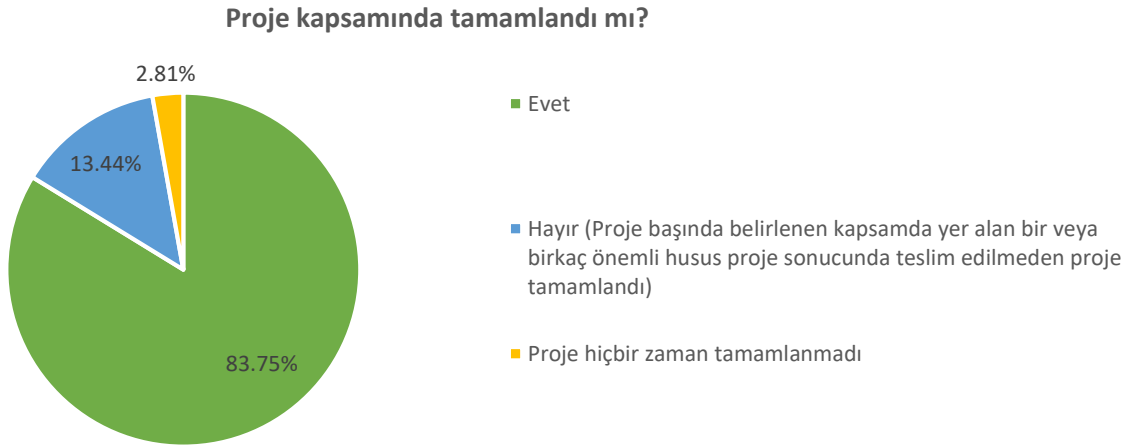

Proje Başarı Faktörleri:

- Projenin başarı ile sonuçlanmasında en çok etkisi olduğunu düşünülen 3 faktör;
 - ✓ Net belirlenmiş gereksinimler
 - ✓ Doğru ve etkili planlama
 - ✓ Üst yönetim desteği
- Projenin başarısızlık ile sonuçlanmasında en çok etkisi olduğunu düşünülen 3 faktör;
 - ✓ Eksik belirlenmiş gereksinimler
 - ✓ Gerçekdışı beklentiler
 - ✓ Kaynakların yetersiz olması
